



2 sellos

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Oficio No.: VRAD/E/238/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 09 de octubre de 2018.

DOCTOR
SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
 PRESENTE:



Por este conducto y en atención al oficio número: 511-3/2018.-0511 de mayo de 2018 y en alcance al similar número: 511/2015.-0373; por este conducto me permito enviarle el informe de los avances con fecha corte 30 de septiembre de 2018, de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018. (Anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molere"

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada.

VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
 DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.-Para su conocimiento.
 Archivo.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2018
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0

PRIMORDIA 1

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

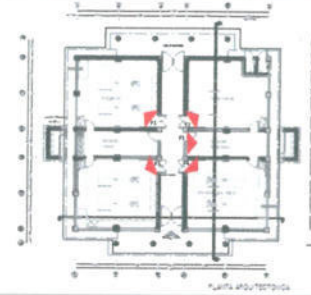

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorganica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Vista Interior Almacen de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatología/Micro



F5: Vista Interior O...

DR. MODESTO SEARA LAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2018
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance


0

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

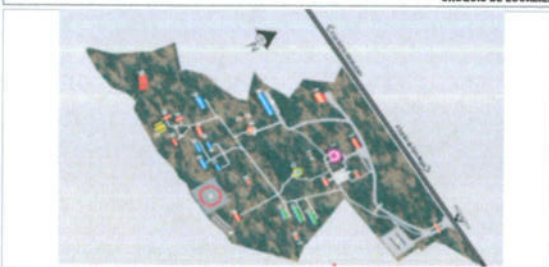

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliucuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada principal Biblioteca



F2: Área Superior de Biblioteca para Instalar Domo

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"




F3: Fachada Auditorio




F4: Puertas CAPFCE del edificio de Aulas



F5: Fachada Centro de libros


DR. AUGUSTO SERNA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Es muy importante que el reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se sugiere que, si se podrán copiar tantas pefafas como sea necesario.
Para el momento de mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.


ARACELI CUEVAS BAVA
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2018
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

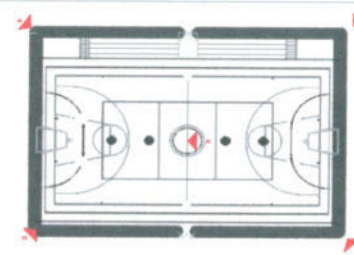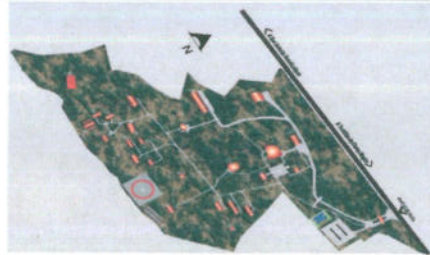

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7, Paraje Tillecutitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples



F2: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples



F3: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples



F4: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra en proceso de Licitación.

[Handwritten signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



DR. MCESTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

[Handwritten signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Este reporte fotográfico debe contener el reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para el mantenimiento/mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2018
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

PRORIDAD: 8 Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathormetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltacustitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada posterior del Edificio



F2: Fachada posterior lado poniente

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Área para instalación de Wathormetros



F4: Fachada posterior



F5: Perspectiva fachada posterior

DR. MOCESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que en el informe fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para complementar las fotografías, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2018
FECHA DE CORTE: 30/9/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSU0032V

RESPONSABLES

Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext.: 200**
Correo electrónico: **vies_admin@unca.edu.mx**

Planeación

Nombre: **ARG. MELANY CUEVAS MANUEL**
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext.: 200**
Correo electrónico: **melany0@hotmail.com**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustantivable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X					\$ 3,119,262.00	\$ -	\$ 3,119,262.00					0				El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X				\$ 950,650.00	\$ -	\$ 950,650.00					0				El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
3	Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.			X			\$ 1,620,282.96	\$ -	\$ 1,620,282.96					0				Con fecha 26 de Junio fue autorizado el cambio de proyecto. Actualmente se encuentra en proceso de Licitación.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
8	Reemplazo de Bóilers de gas por calentadores solares e implementación de Weatherímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.		X				\$ 187,532.00	\$ -	\$ 187,532.00					0				El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
							\$5,877,727.76	\$0.00	\$5,877,727.76															



DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Se asegura la veracidad de los datos que se reportan en el presente informe. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
En esta sección se describe de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
Es necesario que las fechas de inicio y término sean actualizadas. Todos en dos dígitos: dd, mm y aa.

[Firma manuscrita]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
