



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"



Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-109/2024.
Asunto:	Informe del primer trimestre del FAM 2024.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de abril de 2024.

Doctora

**Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
Directora General de Educación Superior  
Universitaria e Intercultural "DGESUI"  
Secretaría de Educación Pública

Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2024-0622-41 signado con fecha 07 de febrero de 2024 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2024, correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha de corte 31 de marzo de 2024, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.


Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

**L.C.E. Alfonso Martínez López**  
Vice-Rector de Administración



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
  - Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior, SEP.- Para su conocimiento.
  - Mtro. Farid Acevedo López.- Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.
  - Mtra. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.- Secretaria de Educación del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.
  - Lic. Emmanuel Alejandro López Jarquín.- Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, OICIFED.- Mismo fin.
  - M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional, UNCA.- Mismo fin.
  - I.E. Armando Marín Nieto.- Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, UNCA. Mismo fin.
- Archivo.

2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
**ENERO-MARZO**

Fecha de elaboración: 05/04/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: OAXACA  
Clave SIP: 03AR0029

Nombre: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Cargo: VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Teléfono: (036) 372 07 15, Ext. 200  
Correo electrónico: vicar\_admin@unca.edu.mx

Nombre: IRL ARMANDO MARÍN NETO  
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (036) 372 07 15, Ext. 200  
Correo electrónico: supervisor-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIPAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	Reajuste (E) +/- 0	Equipos físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas				
					No. (G) de Contrato (A)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratos			Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado O.A.-B	Número del Equipamiento	Cantidad			Monto Cuadrado	Inicio		Termino	Línea de Crédito	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta Físico) MONTO	Fecha	Acta Administrativo de Entrega-Recepción (Forma DGESU) MONTO	Fecha
						INICIO	TERMINO																				
1	5	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 8,071,747.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 8,071,747.00	\$ -	\$ -	Laboratorio de Tecnologías de Información 1 Laboratorio Clínico 1 Laboratorio de Investigación 1 Laboratorio de Farmacología 1 Laboratorio de Química 1 Edificio de Servicios Generales 1 <b>TOTAL 6 0.00</b>	0.00%	-	-	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	
2	6	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 4,960,000.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 4,960,000.00	\$ -	\$ -	Cafetería 304 M2 <b>TOTAL 304 0.00</b>	0.00%	-	-	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-		
3	3	ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.	X	\$ 1,000,000.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	Laboratorio 1 <b>TOTAL 1 0.00</b>	0.00%	-	-	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-		
5	1	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 1,360,721.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 1,360,721.00	\$ -	\$ -	Mantenimiento y rehabilitación de mobiliario escolar 1 Instalación de bases económicas y de libros 1 <b>TOTAL 2 0.00</b>	0.00%	01/2023	23/03/24	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-		
				\$15,812,468.00						\$15,812,468.00	\$0.00	\$0.00															

OBRAS  
 IRL ARMANDO MARÍN NETO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
 VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA  
 IRL MAMA DE LOS ANGELES PERALTA AMARAL

Universidad de la Cañada  
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

1 En esta sección se detallan los datos de la obra y los datos de los contratos a realizar, mismos que se deben reflejar en el reporte trimestral.  
 2 En esta sección se detallan los datos de la obra y los datos de los contratos a realizar, mismos que se deben reflejar en el reporte trimestral.  
 3 En esta sección se detallan los datos de la obra y los datos de los contratos a realizar, mismos que se deben reflejar en el reporte trimestral.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 06/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PRICIDAD: 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tittacuattitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

FI: LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

FI: LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO

Observaciones:

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

FI: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

FI: LABORATORIO DE QUÍMICA

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

FI: LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA

ING. ALVARADO MARIN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN  
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ  
VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 06/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%

PROYECTO: 2 Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Observaciones:



INSTRUMENTOS  
ING. ARMANDO MARIN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN  
LIC. SALOMÓN BARRERA JÓSE  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA  
MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 08/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: 3 Nombre de la obra: ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

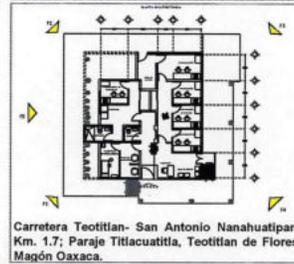

Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliacuatlán, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Observaciones:


EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO



PLANEACIÓN  
ING. IRIBRANDO MARIN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.



PLANEACIÓN  
LICE. ROSARIO ESCOBAR  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PENALTA ARIAS.

NOTA:  
\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 08/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PRIOIDAD 5

Nombre de la obra: MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatitla, Teotitlan de Flores Maqón Oaxaca.

FOTOS

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F1: Serbaltes institucionales

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F2: Serbaltes generales

Observaciones :

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F3: Serbaltes escritorio

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F4: Serbaltes vicerectorales

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F5: Serbaltes biblioteca

UNCA  
OBRAS  
ING. ARMANDO MARIN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

UNCA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNCA  
RECTORÍA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA
